



**Primăria Municipiului
București**



**Unitatea de Implementare a
Proiectului - ISPA**

Buletin informativ

Iunie 2008

În cadrul campaniei inițiate de către Municipalitate pentru informarea cetățenilor Bucureștiului asupra stadiului lucrărilor la proiectul “Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate, București - Glina”, vă aducem la cunoștință progresele înregistrate în ultima vreme.

1. Împrejmuirea

Așa cum am precizat în buletinul informativ anterior, construcția gardului ce împrejmuește șantierul a fost finalizată încă din decembrie anul trecut.



Gardul care împrejmuește Stația

2. Sistemul de supraveghere

Pentru asigurarea unei bune securități a viitoarei stații de epurare, a fost finalizat sistemul de iluminat perimetral și, de asemenea, au fost instalate camere de luat vederi cu circuit închis.



Camera video din sistemul de supraveghere CCTV

3. Reabilitarea clădirilor civile

Accesul în incinta stației de epurare se face printr-o cabină de poartă, clădire existentă de la vechiul amplasament. De curând aceasta a fost renovată prin refacerea instalațiilor, a finisajelor, precum și prin înlocuirea vechii tâmplăriei cu o alta nouă, din PVC.

Etajul 1 al clădirii administrative a fost renovat în totalitate, aici fiind deja instalate birourile firmei constructoare și ale firmei ce asigură supervizarea lucrărilor de construcție.

În continuare se fac lucrări de reabilitare la nivelul parterului, aici urmând să fie amplasate laboratoarele de analiza apelor uzate.(influent și efluent).

Lucrarile de reabilitare a cladirilor din incinta statiei continua cu hidroizolatiile planseelor de la cabina de poarta, de la atelierul mecanic , precum si inlocuirea tamplariei cladirii ce adaposteste spalatoria si grupurile sanitare



Clădirea administrativă după renovare

4. Lucrări de demolare

Recent a fost încheiată demolarea podurilor aferente bazinelor de aerare de la Linia 1, conform propunerii constructorului privind consolidarea acestor bazine. Lucrările de demolare la Linia 2 sunt în derulare.




Demolarea podurilor bazinelor de aerare

5. Lucrări de modernizare

În prezent sunt în curs de derulare lucrările de modernizare a celor opt decantoare primare, precum și lucrările pentru decantoarele secundare, acestea reprezentând o construcție nouă.

Totodată au fost efectuate și primele probe de apă pentru verificarea bazinelor de fermentare a nămolului.

De asemenea, s-au început lucrările la terasamentele pentru bazinele de stocare a apelor pluviale și, în curând vor fi începute și lucrările la digestoare..

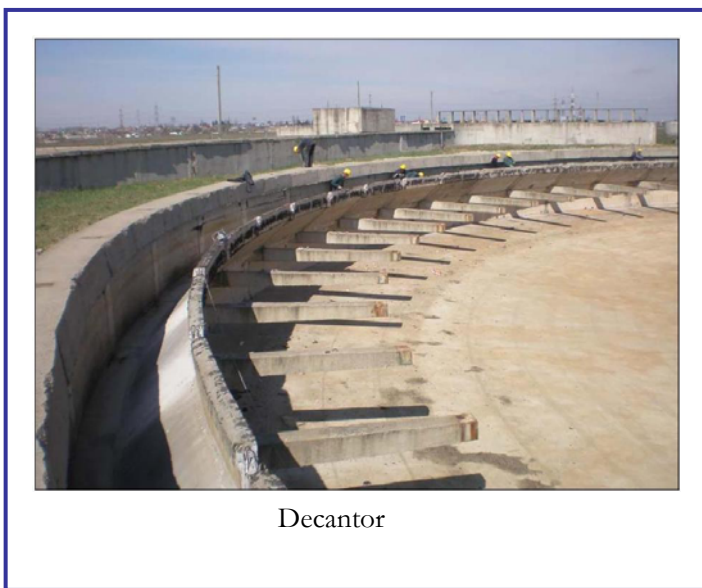

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Serviciul pentru Relația cu Mass-Media

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

etaj I, camera 133

tel.: 305 55 03

fax: 305 55 04

e-mail: presa@bucuresti-primaria.ro

Adresa pentru eventuale reclamații: ispa@mfinante.ro

www.pmb.ro



Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - Etapa I

Editor: Unitatea de Implementare a Proiectului

Iunie 2008

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene”
