

PUNCTUL NR. 13

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului pe etape cu privire la demararea proiectului Stația de Epurare a Municipiului București Glina Faza II, împreună cu lucrările de reabilitare colectoare de apă uzată și Caseta de Apă – Uzată – Dâmbovița

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Utilități Publice și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În scopul administrării unitare a Sistemului de canalizare al Municipiului București, prin întreținerea și exploatarea eficientă a Sistemului de canalizare, cât și eliminarea unor riscuri în funcționarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București Glina;

Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 60/09.03.2010 privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București de a întreprinde toate demersurile necesare către Guvernul României, în vederea asigurării co-finanțării (fonduri de coeziune) pentru acoperirea deficitului de finanțare necesar finalizării Fazei II – Glina, împreună cu lucrările de reabilitare colectoare de apă uzată și Caseta de Apă – Uzată – Dâmbovița;

Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 70/28.04.2011 privind modificarea listei bunurilor proprietate publică aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 296/1999 concesionate S.C. Apa Nova București S.A. în baza Contractului de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, și aprobarea Actului Adițional nr.7 la Contractul de Concesiune;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2098/02.07.2010 și Nota revizuită nr. 2618/ 06.08.2010 transmise de Primarul General al Municipiului București către Ministerul Mediului și Pădurilor în scopul întocmirii Aplicației pentru obținerea finanțării din Fondurile de Coeziune pentru proiectul Stația de Epurare a Municipiului București Glina Faza II și reabilitarea colectoare de apă uzată și Caseta de Apă – Uzată – Dâmbovița;

Văzând răspunsul formulat de Comisia Europeană nr. 659480/04.10.2010;

Luând în considerare prevederile Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 1560/17.11.2010 cu privire la constituirea Comitetului de Coordonare a proiectului Stația de Epurare a Municipiului București Glina Faza II;

În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de România ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, în special a celor din sectorul apă și apă uzată, respectiv pentru îndeplinirea conformării cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea și epurarea apelor uzate – până în 2015;

În baza prevederilor Memorandumului de Finanțare aferent Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitoare la abordarea pe faze a reabilitării Stației de Epurare a Apelor Uzate ;

Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 62/13.04.2011 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2011 și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 41/ 28.02.2011;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE**

Art. 1 Se aprobă Programul pe etape cu privire la demararea proiectului Stația de Epurare a Municipiului București Glina Faza II, împreună cu lucrările de reabilitare colectoare de apă uzată și Caseta de Apă – Uzată – Dâmbovița, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2 Finanțarea proiectului Stația de Epurare a Municipiului București Glina Faza II, împreună cu lucrările de reabilitare colectoare de apă uzată și a Casetei de Apă – Uzată – Dâmbovița este detaliată în anexa nr. 2. Sumele alocate se încadrează în prevederile aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 62/13.04.2011.

Art. 3 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința.....a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
TUDOR TOMA

București,
Nr.

Programul pe etape cu privire la demararea proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita

1) Servicii de consultanta pentru:

a) SF1 – Linia II de epurare a apei uzate, tratare namol

Termen de finalizare: august 2011

b) SF 2 – Incinerare namol

Termen de finalizare: august 2011

c) SF 3 - reabilitarea colectoarelor de apa uzata

Termen de finalizare: sfarsitul lunii Noiembrie 2011

d) SF 4 - reabilitarea Casetei de Apa Uzata - Dambovita

Termen de finalizare: sfarsitul lunii Noiembrie 2011

e) Asistenta tehnica pentru managementul proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita

Termen de contractare: August 2011

f) Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita

Termen de contractare: Decembrie 2011

2) Finalizarea Aplicatiei si transmiterea la Comisia Europeana


Termen de finalizare: Octombrie 2011

3) Aprobarea finantarii de catre Comisia Europeana:

Termen de finalizare: Ianuarie 2012

4) Parcurgerea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de lucrari

Termen de finalizare: Aprilie 2012



Splaiul Independentei nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, Romania

Tel.:

<http://www.pmb.ro>



Finantarea proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita

1. ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI STATIA DE EPURARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI GLINA FAZA II, IMPREUNA CU LUCRARILE DE REABILITARE COLECTOARE DE APA UZATA SI CASETA DE APA UZATA – DAMBOVITA

Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare 2012 - 2016	Valoare totala
5.220	33.933	39.153

2. INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU REABILITAREA COLECTOARELOR DE APA UZATA (SF 3)

Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare totala
2.610	2.610

3. INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU REABILITAREA CASETEI DE APA UZATA – DAMBOVITA (SF 4)

Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare totala
2.610	2.610

4. ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR PROIECTULUI STATIA DE EPURARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI GLINA FAZA II, IMPREUNA CU LUCRARILE DE REABILITARE COLECTOARE DE APA UZATA SI CASETA DE APA UZATA – DAMBOVITA

Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare 2012 - 2016	Valoare totala
523	30.800	31.323



Splaiul Independenței nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, București, România

Tel.:

<http://www.pmb.ro>





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Cabinet Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Programului pe etape cu privire la demararea proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita

Ca urmare a aderarii României la Uniunea Europeana, au rezultat o serie de angajamente care implica investitii considerabile în sectorul de apa si apa uzata, în decursul unor perioade de timp relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obtinut perioade de tranzitie pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descarcarea si epurarea apelor uzate – pâna în 2015 pentru 263 aglomerari prioritare, una dintre acesta fiind Municipiul Bucuresti.

Potrivit Memorandumului de Finantare, pentru Masura ISPA 2004/RO/16/P/PE/003, semnat de partea comunitara la data de 13 decembrie 2004 si de partea româna la data de 14 februarie 2005, asigurarea nivelului conform de epurare a apelor uzate se va realiza prin finalizarea si modernizarea Statiei de epurare - Glina, în doua Faze:

Faza I, finantata prin instrumentul financiar ISPA – reprezinta finalizarea Liniei 1 a statiei de epurarea apelor uzate.

Termenul prognozat de punere în functiune a Liniei 1 a Statiei de Epurare - Glina este iulie 2010.

Faza II propusa spre finantare din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial de Mediu va include:

- ✓ construirea unei noi linii - Linia 2, pornind de la performantele Liniei 1 si tinând cont de prevederile legale în materie;
- ✓ solutionarea gestionarii namolului rezultat din procesul de epurare a apei uzate din ambele linii si construirea unui incinerator care sa prelucreze întreaga productie de namol.

Finantarea prin POS Mediu a Fazei II impune în principal, respectarea urmatoarelor conditii solicitate de catre reprezentantii Comisiei Europene si agreeate în întâlniri anterioare cu conducerea Primariei Municipiului Bucuresti, pentru realizarea carora este necesara finantarea combinata din partea Comisiei Europene si a autoritatilor române, astfel:

- Realizarea unei ample campanii de masuratori pentru determinarea debitelor si a încarcarilor apelor uzate, cu scopul de a obtine informatii corecte, cat si concluzii privind performanta tehnologica a Liniei 1, în vederea dimensionarii Liniei 2; campania de masuratori se va efectua în primele 12 luni de functionare a Liniei 1;

- Realizarea lucrarilor de reducere a infiltratiilor de apa freatica în sistemul de canalizare al Municipiului Bucuresti si Caseta râului Dâmbovita, în vederea evitarii realizarii unor supracapacitati a statiei de epurare, prin:

- reabilitare colectoare de canalizare pentru cresterea etansietatii, situate astazi în stratul de apa freatica, în lungime de aprox. 30 Km;

- lucrari de urgenta si lucrari de fond, necesare cresterii etansietatii, la Caseta de apa uzata aferenta râului Dâmbovita.

Lucrarile mentionate anterior, presupun realizarea urmatoarelor investitii:

- 1 - construirea unei noi linii de epurare a apelor uzate - Linia 2, pornind de la performantele Liniei 1, inclusiv realizarea incineratorului pentru solutionarea gestionarii namolului rezultat din procesul de epurare
- 2 - reabilitarea colectoarelor de canalizare, cu o lungime de aprox. 30 Km
- 3 - reabilitarea Casetei râului Dâmbovita – lucrari de urgenta si lucrari de fond, inclusiv decolmatare pe lungime de 17km
- 4 – consultanta, mangement , supraveghere lucrari.

Demersurile intreprinse la nivelul Municipiului Bucuresti pentru solutionarea problemelor legate de functionarea Casetei raului Dambovita sunt:

- (a) Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 346 / 22.10.2009 prin care Primarul General a fost imputernicit sa semneze si sa transmita o solicitare catre Guvernul Romaniei cu privire la emiterea unei Hotarari referitoare la trecerea din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale Apele Romane in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a Canalului Colector de sub raul Dambovita (Casete de Apa Uzata);
- (b) Actul Adicional nr. 6/14.12.2009 la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pentru Municipiul Bucuresti, semnat la data de 29.03.2000 intre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. – prin care Partile Contractului de Concesiune au convenit cu privire la integrarea Casetei în Sistemul de Canalizare si, respectiv, în Concesiunea serviciului de canalizare;
- (c) Dispozitia nr. 310 / 15.03.2010 – prin care Primarul General al Municipiului Bucuresti a aprobat constituirea Grupului de Lucru pentru analiza si propuneri in legatura cu trecerea din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale « Apele Române » în domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a Canalului Colector Ape Uzate (casete de Apa Uzata)
- (d) Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 60 / 9.03.2010, Primarul General al Municipiului Bucuresti a fost imputernicit sa intreprinda toate demersurile necesare catre Guvernul Romaniei, in vederea asigurarii co-finantarii pentru acoperirea deficitului de finantare necesar finalizarii Fazei II – Glina, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si caseta de Apa Uzata – Dambovita..
- (e) Dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti nr. 1559 / 17.11.2010, cu privire la constituirea Grupului de Lucru al Primariei Municipiului Bucuresti pentru elaborarea Actului Adicional nr. 7 la Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti, in calitate de Concedent, si SC Apa Nova Bucuresti S.A., in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti
- (f) Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 70 / 28.04.2011 privind modificarea listei bunurilor proprietate publica aprobata prin Hotarârea C.G.M.B. nr. 296/1999 concesionate SC Apa Nova Bucuresti S.A. în baza Contractului de Concesiune nr.1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti, in calitate de Concedent, si SC Apa Nova Bucuresti S.A., in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, si aprobarea Actului Adicional nr.7 la Contractul de Concesiune
- (g) Protocolul nr. 1727 / 17.05.2011, semnat intre Municipiul Bucuresti, Ministerul Mediului si Padurilor si Admnistratia Nationala Apele Romane, de predare-preluare din/în patrimoniu a canalului colector ape uzate de sub râul Dâmbovita „CASETA de apa uzata”;
- (h) Actul Adicional nr. 7 / 17.05.2011 la Contractul de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare în Municipiul Bucuresti;



(i) Proces Verbal nr. 1729 / 17.05.2011 între Municipiul Bucuresti si Apa Nova Bucuresti, de predare-primire în concesiune a canalului colector de ape uzate de sub râul Dâmbovița „CASETA de apa uzata”

Urmare a HCGMB nr. 60 / 9.03.2010, Primarul General a transmis in data de 5.07.2010 Ministerului Mediului si Padurilor o Nota de Fundamentare care sa stea la baza intocmirii Aplicatiei pentru obtinerea finantarii din Fondurile de coeziune pentru proiectul Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita.

Conform documentatiei avizate de Comisia Europeana in 4.10.2010, suma destinata serviciilor de consultanta, management si supraveghere a lucrarilor este de 14.5 mil. Euro

Prezentul proiect de Hotarare contine:

(a) Programul pe etape cu privire la demararea proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita:

1) Servicii de consultanta pentru:

a) Studiu de Fezabilitate 1 – Linia II de epurare a apei uzate, tratare namol

Termen de finalizare: august 2011

b) Studiu de Fezabilitate 2 – Incinerare namol

Termen de finalizare: august 2011

c) Studiu de Fezabilitate 3 - reabilitarea colectoarelor de apa uzata

Termen de finalizare: sfarsitul lunii Noiembrie 2011

d) Studiu de Fezabilitate 4 - reabilitarea Casetei de Apa Uzata - Dambovita

Termen de finalizare: sfarsitul lunii Noiembrie 2011

e) Asistenta tehnica pentru managementul proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita

Termen de contractare: August 2011

f) Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita

Termen de contractare: Decembrie 2011

2) Finalizarea Aplicatiei si transmiterea la Comisia Europeana

Termen de finalizare: Octombrie 2011

3) Aprobarea finantarii de catre Comisia Europeana:

Termen de finalizare: Ianuarie 2012

4) Parcurgerea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de lucrari

Termen de finalizare: Aprilie 2012

(b) Finantarea proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare a colectoarelor de apa uzata si a Casetei de Apa – Uzata – Dambovita este detaliata mai jos. Sumele alocate se incadreaza in prevederile HCGMB nr. 62 / 13.04.2011.

(1) Asistenta tehnica pentru managementul proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa Uzata – Dambovita

Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare 2012 - 2016	Valoare totala
5.220	33.933	39.153

2. Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea colectoarelor de apa uzata (SF 3)
Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare totala
2.610	2.610

3. Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea Casetei de Apa Uzata – Dambovita (SF4)
Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare totala
2.610	2.610

4. Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa Uzata – Dambovita


Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare 2012 - 2016	Valoare totala
523	30.800	31.323

În scopul administrării unitare a Sistemului de canalizare al Municipiului Bucuresti, prin întreținerea și exploatarea eficientă a Sistemului de canalizare, cât și eliminarea unor riscuri în funcționarea Stației de Epurare a Apelor Uzate Bucuresti Glina și pentru derularea în bune condiții a proiectului Stația de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, împreună cu lucrarile de reabilitare colectoare de apă uzată și Caseta de Apa – Uzată – Dambovita și respectarea angajamentelor României la Uniunea Europeană care implică investiții considerabile în sectorul de apă și apă uzată, propun Consiliului General al Municipiului Bucuresti spre aprobare prezentul proiect de Hotărâre

PRIMAR GENERAL

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU

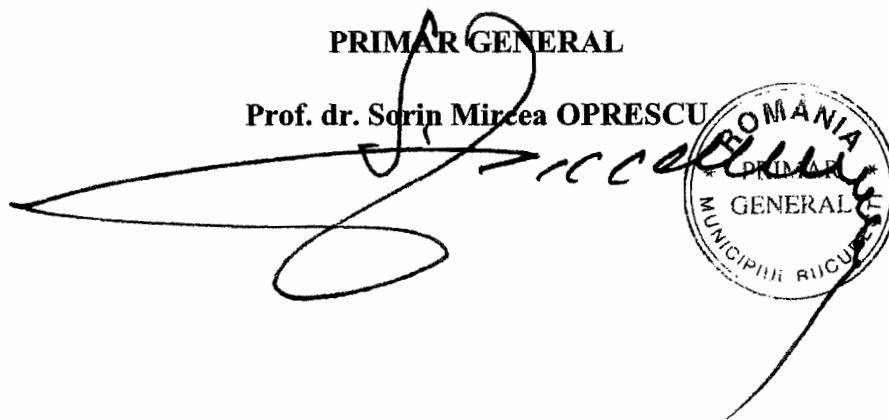

Avizat

Directia Juridic

Director Executiv

Adriana IORDACHE





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice

Directia Utilitati Publice

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Programului pe etape cu privire la demararea proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita

Ca urmare a aderarii României la Uniunea Europeana, au rezultat o serie de angajamente care implica investitii considerabile în sectorul de apa si apa uzata, în decursul unor perioade de timp relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obtinut perioade de tranzitie pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descarcarea si epurarea apelor uzate – pâna în 2015 pentru 263 aglomerari prioritare, una dintre acesta fiind Municipiul Bucuresti.

Potrivit Memorandumului de Finantare, pentru Masura ISPA 2004/RO/16/P/PE/003, semnat de partea comunitara la data de 13 decembrie 2004 si de partea româna la data de 14 februarie 2005, asigurarea nivelului conform de epurare a apelor uzate se va realiza prin finalizarea si modernizarea Statiei de epurare - Glina, în doua Faze:

Faza I, finantata prin instrumentul financiar ISPA – reprezinta finalizarea Liniei 1 a statiei de epurarea apelor uzate.

Termenul prognozat de punere în functiune a Liniei 1 a Statiei de Epurare - Glina este iulie 2010.

Faza II propusa spre finantare din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial de Mediu va include:

- ✓ construirea unei noi linii - Linia 2, pornind de la performantele Liniei 1 si tinând cont de prevederile legale în materie;
- ✓ solutionarea gestionarii namolului rezultat din procesul de epurare a apei uzate din ambele linii si construirea unui incinerator care sa prelucreze întreaga productie de namol.

Finantarea prin POS Mediu a Fazei II impune în principal, respectarea urmatoarelor conditii solicitate de catre reprezentantii Comisiei Europene si agreeate în întâlniri anterioare cu conducerea Primariei Municipiului Bucuresti, pentru realizarea carora este necesara finantarea combinata din partea Comisiei Europene si a autoritatilor române, astfel:

- Realizarea unei ample campanii de masuratori pentru determinarea debitelor si a încarcarilor apelor uzate, cu scopul de a obtine informatii corecte, cat si concluzii privind performanta tehnologica a Liniei 1, în vederea dimensionarii Liniei 2; campania de masuratori se va efectua în primele 12 luni de functionare a Liniei 1;

- Realizarea lucrarilor de reducere a infiltratiilor de apa freatica în sistemul de canalizare al Municipiului Bucuresti si Caseta râului Dâmbovita, în vederea evitarii realizarii unor supracapacitati a statiei de epurare, prin:

- reabilitare colectoare de canalizare pentru cresterea etansietatii, situate astazi în stratul de apa freatica, în lungime de aprox. 30 Km;

- lucrari de urgenta si lucrari de fond, necesare cresterii etansietatii, la Caseta de apa uzata aferenta râului Dâmbovita.

Lucrarile mentionate anterior, presupun realizarea urmatoarelor investitii:

- 1 - construirea unei noi linii de epurare a apelor uzate - Linia 2, pornind de la performantele Liniei 1, inclusiv realizarea incineratorului pentru solutionarea gestionarii namolului rezultat din procesul de epurare
- 2 - reabilitarea colectoarelor de canalizare, cu o lungime de aprox. 30 Km
- 3 - reabilitarea Casetei râului Dâmbovita – lucrari de urgenta si lucrari de fond, inclusiv decolmatare pe lungime de 17km
- 4 – consultanta, magement , supraveghere lucrari.

Demersurile intreprinse la nivelul Municipiului Bucuresti pentru solutionarea problemelor legate de functionarea Casetei raului Dambovita sunt:

- (a) Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 346 / 22.10.2009 prin care Primarul General a fost imputernicit sa semneze si sa transmita o solicitare catre Guvernul Romaniei cu privire la emiterea unei Hotarari referitoare la trecerea din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale Apele Romane in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a Canalului Colector de sub raul Dambovita (Casete de Apa Uzata);
- (b) Actul Aditional nr. 6/14.12.2009 la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pentru Municipiul Bucuresti, semnat la data de 29.03.2000 intre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. – prin care Partile Contractului de Concesiune au convenit cu privire la integrarea Casetei în Sistemul de Canalizare si, respectiv, în Concesiunea serviciului de canalizare;
- (c) Dispozitia nr. 310 / 15.03.2010 – prin care Primarul General al Municipiului Bucuresti a aprobat constituirea Grupului de Lucru pentru analiza si propuneri in legatura cu trecerea din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale « Apele Române » în domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a Canalului Colector Ape Uzate (casete de Apa Uzata)
- (d) Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 60 / 9.03.2010, Primarul General al Municipiului Bucuresti a fost imputernicit sa intreprinda toate demersurile necesare catre Guvernul Romaniei, in vederea asigurarii co-finantarii pentru acoperirea deficitului de finantare necesar finalizarii Fazei II – Glina, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si caseta de Apa Uzata – Dambovita..
- (e) Dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti nr. 1559 / 17.11.2010, cu privire la constituirea Grupului de Lucru al Primariei Municipiului Bucuresti pentru elaborarea Actului Adicional nr. 7 la Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti, in calitate de Concedent, si SC Apa Nova Bucuresti S.A., in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti
- (f) Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 70 / 28.04.2011 privind modificarea listei bunurilor proprietate publica aprobata prin Hotarârea C.G.M.B. nr. 296/1999 concesionate SC Apa Nova Bucuresti S.A. în baza Contractului de Concesiune nr.1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti, in calitate de Concedent, si SC Apa Nova Bucuresti S.A., in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, si aprobarea Actului Adicional nr.7 la Contractul de Concesiune
- (g) Protocolul nr. 1727 / 17.05.2011, semnat intre Municipiul Bucuresti, Ministerul Mediului si Padurilor si Administratia Nationala Apele Romane, de predare-preluare din/în patrimoniu a canalului colector ape uzate de sub râul Dâmbovita ,”CASETA de apa uzata”;
- (h) Actul Adicional nr. 7 / 17.05.2011 la Contractul de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare în Municipiul Bucuresti;

(i) Proces Verbal nr. 1729 / 17.05.2011 între Municipiul Bucuresti si Apa Nova Bucuresti, de predare-primire în concesiune a canalului colector de ape uzate de sub râul Dâmbovița „CASETA de apa uzata”

Urmare a HCGMB nr. 60 / 9.03.2010, Primarul General a transmis in data de 5.07.2010 Ministerului Mediului si Padurilor o Nota de Fundamentare care sa stea la baza intocmirii Aplicatiei pentru obtinerea finantarii din Fondurile de coeziune pentru proiectul Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita.

Conform documentatiei avizate de Comisia Europeana in 4.10.2010, suma destinata serviciilor de consultanta, management si supraveghere a lucrarilor este de 14.5 mil. Euro

Prezentul proiect de Hotarare contine:

(a) Programul pe etape cu privire la demararea proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita:

1) Servicii de consultanta pentru:

a) Studiu de Fezabilitate 1 – Linia II de epurare a apei uzate, tratare namol

Termen de finalizare: august 2011

b) Studiu de Fezabilitate 2 – Incinerare namol

Termen de finalizare: august 2011

c) Studiu de Fezabilitate 3 - reabilitarea colectoarelor de apa uzata

Termen de finalizare: sfarsitul lunii Noiembrie 2011

d) Studiu de Fezabilitate 4 - reabilitarea Casetei de Apa Uzata - Dambovita

Termen de finalizare: sfarsitul lunii Noiembrie 2011

e) Asistenta tehnica pentru managementul proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita

Termen de contractare: August 2011

f) Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa – Uzata – Dambovita

Termen de contractare: Decembrie 2011

2) Finalizarea Aplicatiei si transmiterea la Comisia Europeana

Termen de finalizare: Octombrie 2011

3) Aprobarea finantarii de catre Comisia Europeana:

Termen de finalizare: Ianuarie 2012

4) Parcurgerea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de lucrari

Termen de finalizare: Aprilie 2012

(b) Finantarea proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare a colectoarelor de apa uzata si a Casetei de Apa – Uzata – Dambovita este detaliata mai jos. Sumele alocate se incadreaza in prevederile HCGMB nr. 62 / 13.04.2011.

(1) *Asistenta tehnica pentru managementul proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa Uzata – Dambovita*

Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare 2012 - 2016	Valoare totala
5.220	33.933	39.153

2. Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea colectoarelor de apa uzata (SF 3)

Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare totala
2.610	2.610

3. Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea Casetei de Apa Uzata – Dambovita (SF4)

Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare totala
2.610	2.610

4. Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de Apa Uzata – Dambovita

Mii lei, inclusiv TVA

Valoare 2011	Valoare 2012 - 2016	Valoare totala
523	30.800	31.323

În scopul administrării unitare a Sistemului de canalizare al Municipiului Bucuresti, prin întreținerea și exploatarea eficientă a Sistemului de canalizare, cât și eliminarea unor riscuri în funcționarea Stației de Epurare a Apelor Uzate Bucuresti Glina și pentru derularea în bune condiții a proiectului Stația de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II, împreună cu lucrarile de reabilitare colectoare de apă uzată și Caseta de Apa – Uzata – Dambovita și respectarea angajamentelor României la Uniunea Europeană care implică investiții considerabile în sectorul de apă și apă uzată, propunem Consiliului General al Municipiului Bucuresti promovarea proiectului de hotărâre anexat.

Director Executiv
Directia Utilitati Publice
Cosmin GHEORGHIU



Director
AMRSP
Adrian CRISAN

